

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和3年8月31日

計画の名称	1 町民の競技力向上と健康増進につながるスポーツ公園を目指す計画			
計画の期間	平成26年度	～	平成29年度	(4年間)
計画の目標	交付対象	岐阜県神戸町		

神戸町が管理運営を行っている「ごうど中央スポーツ公園」野球場は、軟式野球の公式規格に合っていないため、軟式野球の公式試合が開催できない状況となっております。この度、野球場の全面的な再整備を行うことで、軟式野球規格に合ったグラウンドの整備を計画しております。併せて、近年需要が高まっている成人向けの健康遊具の整備及び神戸町においてニーズが高いテニスコートの整備及び不足している駐車場の整備等を行うことで、利用者ニーズを捉えた快適な公園とすることを目指しております。

計画の成果目標（定量的指標）	・ 体育施設利用者数 : 42,625人 (H24年度) → 50,000人 (H30年度)
----------------	--

定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値			備考	
						当初現況値 (H24当初)	中間目標値	最終目標値 (H30)		
体育施設利用状況により、体育施設利用者数を算出する。					42,625	—	50,000			
						—				
						—				
全体事業費	合計 (A+B+C)	百万円	A	1,788	B	0	C	39	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	2.2%

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
神戸町教育部生涯学習課において事後評価を実施	3年8月31日 公表の方法 ホームページに掲載

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業															
A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H25	H26	H27	H28	H29		
1-A-1	公園	一般	神戸町	直接	神戸町	ごうど中央スポーツ公園再整備に係る用地買収・実施設計・施設整備事業	野球場の再整備等7.5ha	神戸町						1,788	
									合計					1,788	
B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H25	H26	H27	H28	H29		
									合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考				
C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H25	H26	H27	H28	H29		
1-C-1	設計委託	一般	神戸町	直接	神戸町	ごうど中央スポーツ公園再整備に係る基本設計事業	基本設計作成	神戸町						6	
1-C-2	道路整備	一般	神戸町	直接	神戸町	ごうど中央スポーツ公園再整備に係る道路改修事業	道路改修 L=152m	神戸町						33	
									合計					39	
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考				
1-C-1	公園事業（1-A-1）を円滑に実施するために基本設計の作成を行う。														
1-C-2	公園事業（1-A-1）と一体的に実施することで、公園と道路の一体的な整備を行う。														

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況



I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・ 道路と公園の一体的な整備の推進により、整備前と比べテニスコート、多目的グラウンド、野球場等の公園施設利用者数が増加した。 ・ 利用者のニーズを捉えた公園整備ができた。			
II 定量的指標の達成状況	指標①（体育施設利用者数）	最終目標値	50,000	目標値と実績値に差が出た要因	計画通り実施できた。
		最終実績値	51,753		
	指標②（）	最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			
	指標③（）	最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					

3. 特記事項（今後の方針等）


<p>今後は公式大会等の積極的な誘致を行い、公園利用者の増加に努める。</p>
---

(参考図面) ごうど中央スポーツ公園再整備事業

計画の名称	1 町民の競技力向上と健康増進につながるスポーツ公園を目指す計画		
計画の期間	平成26年度 ~ 平成29年度 (4年間)	交付対象	岐阜県神戸町

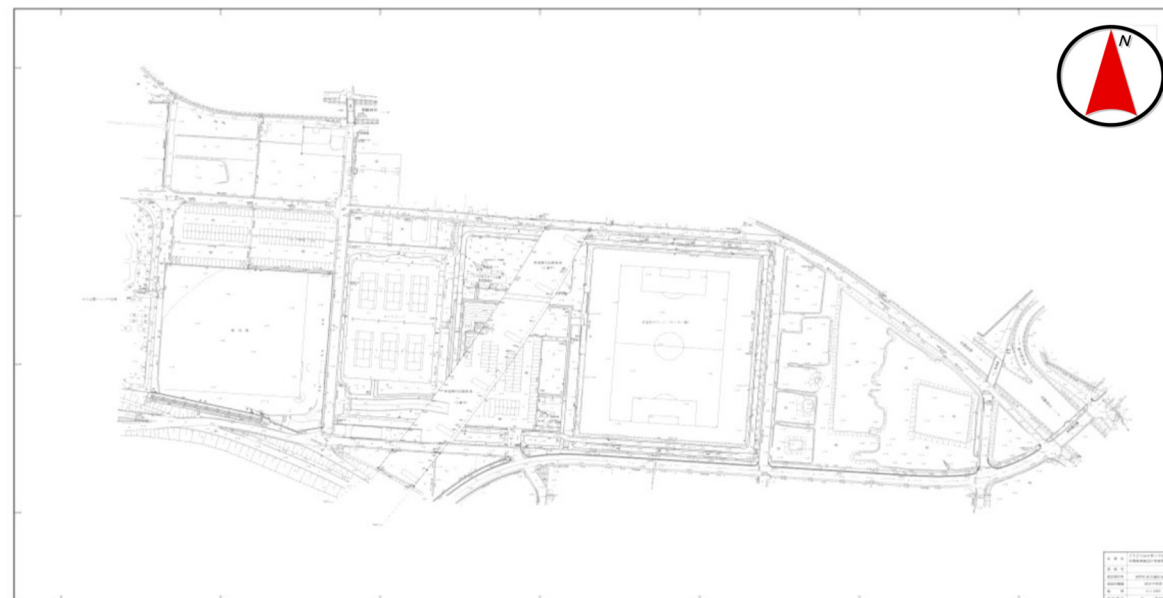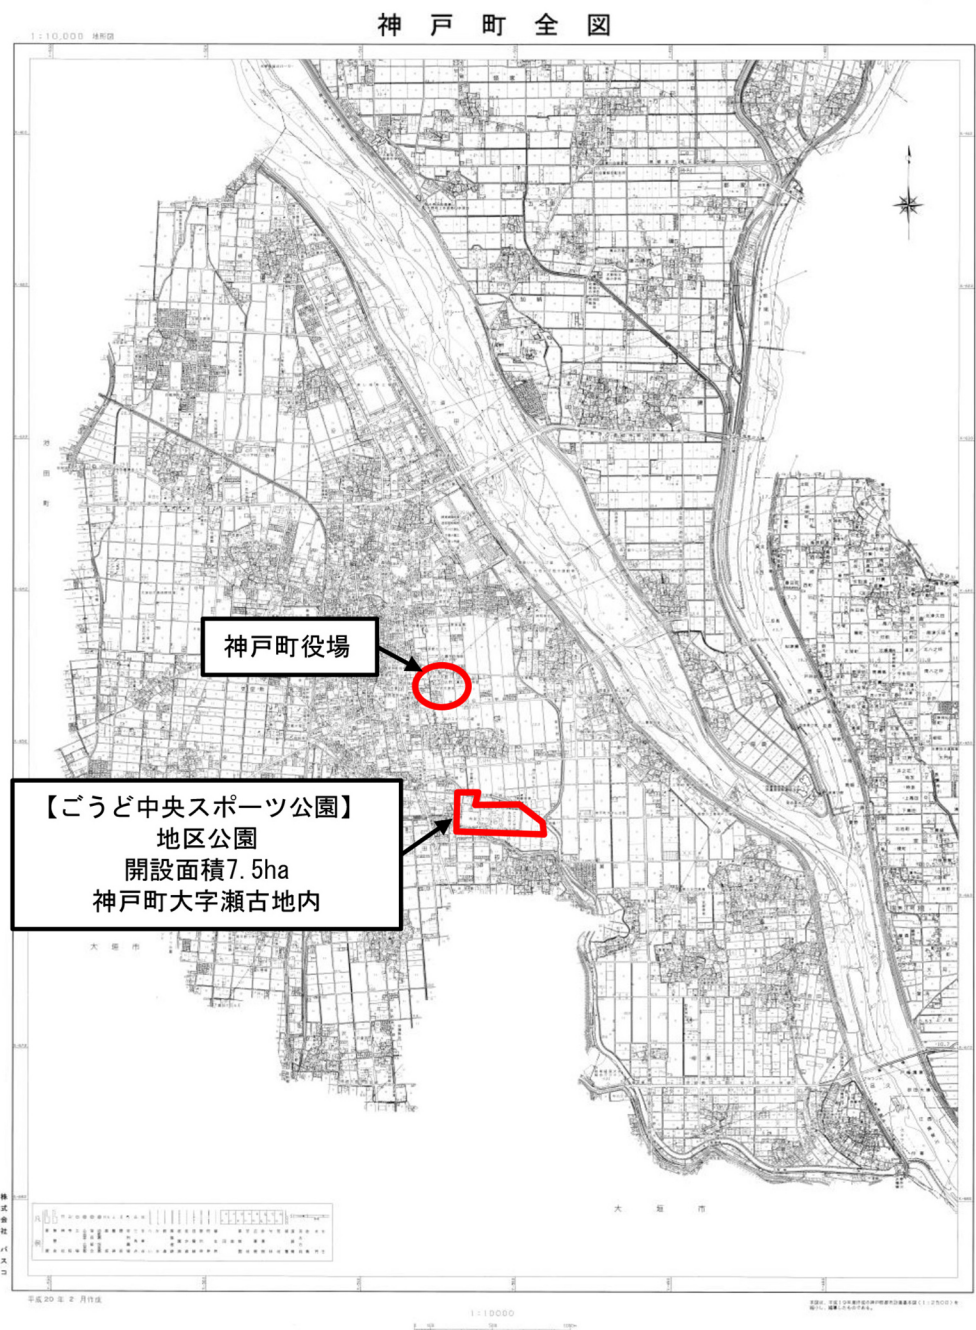

整備前

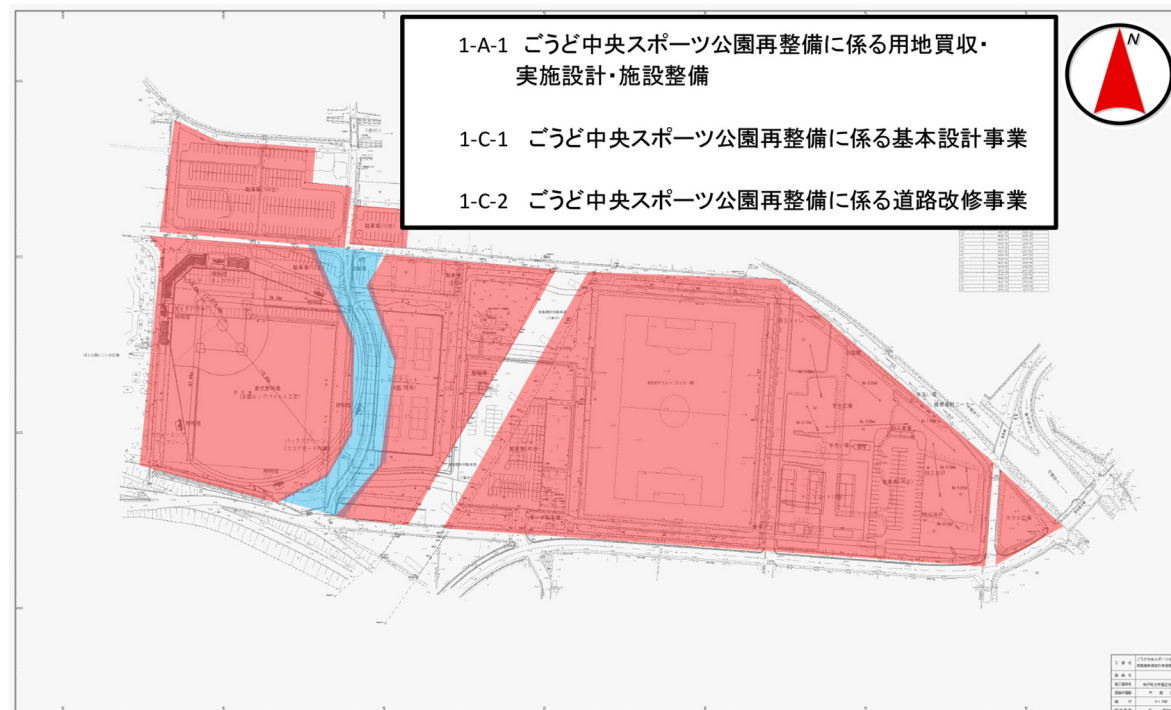

整備後
